



รายงาน

การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2552
ไตรมาสที่ 3

เสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กันยายน 2552

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2552 ซึ่งต้องรายงานผลการติดตามและประเมินตามวัตถุประสงค์ จำนวน 5 ข้อ ได้แก่

1. เพื่อประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นรายไตรมาส
3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมจำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการที่เลือกศึกษา
5. เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ไปปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีต่อไป

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ 2552 ในครั้งนี้ ได้แบ่งการประเมินผลออกเป็นหลายช่วง ได้แก่ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2552) ประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ซึ่งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ตามแบบประเมิน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบในการประเมินจากคู่มือ “การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจึงได้จัดทำรายงานเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ประเมิน

สารบัญ

หน้า

คำนำ

บทที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล	2
วิธีการติดตามและประเมินผล	3
นิยามศัพท์เฉพาะ	3

บทที่ 2 ผลการประเมิน

ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของ อบจ. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2552)	4
--	---

บทที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ของ อบจ. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2552)	15
---	----

เอกสารอ้างอิง	17
---------------	----

ภาคผนวก ก	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2552)	18
-----------	--	----

ภาคผนวก ข	แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	79
-----------	--	----

ภาคผนวก ค	รายนามคณะกรรมการ	91
-----------	------------------	----

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี (2552-2554) ของ อบจ.	5
2	แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและสัดส่วนของงบประมาณไตรมาสที่ 3 เปรียบเทียบกับทั้งปีงบประมาณ 2552	6
3	แสดงจำนวนและร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2552 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2552)	8
4	แสดงจำนวนและร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจำแนกตามช่วงร้อยละของงานทั้งโครงการ	11
5	แสดงงบประมาณทั้งหมดและงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายของ อบจ. ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2552)	12
6	แสดงผลการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2552	14

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่		หน้า
1	แสดงร้อยละของงบประมาณ ปี 2552 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	6
2	แสดงสัดส่วนของงบประมาณในไตรมาสที่ 3 เปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2552	7
3	แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ มีการยกเลิก และมีการเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 3	9
4	แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ มีการยกเลิก และมีการเพิ่มเติมไตรมาสที่ 3 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	10
5	แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ	12
6	แสดงร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2552 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	13

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ เนื่องจากการติดตาม (Monitoring) การปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเมื่อมีปัญหา หรือช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เป็นการลดโอกาสการสูญเสีย สูญเปล่าในการทำงาน ส่วนการประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานระหว่างกำลังดำเนินการ (On-going) และเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (Ex-Post) เป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่าการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนดูความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการตัดสินใจวางแผนในอนาคตต่อไป ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพของนโยบาย งาน แผนงาน และโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา โดยประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (อบจ.) มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด 15 อำเภอ มีโครงการที่ดำเนินงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากให้สถาบันการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงก็จะทำให้ อบจ. สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ดังนั้น อบจ. จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในขอบเขตหน้าที่ของ อบจ. ว่ามีข้อควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป จึงได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ. ประจำปี 2552 ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อบจ.
2. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. เป็นรายไตรมาส
3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบจ. พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของ อบจ. โดยภาพรวมจำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการที่เลือกศึกษา
5. เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ไปปรับปรุงการดำเนินงานของ อบจ. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีต่อไป

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพัฒนาของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2552 ในครั้งนี้ ได้แบ่งการประเมินผลออกเป็นหลายช่วง ได้แก่ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อบจ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552) ในครั้งนี้ ได้ทำการประเมินตามกรอบการติดตามและประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ดังนี้

การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ.

การประเมินในส่วนนี้ จะทำการติดตามการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนการดำเนินงานประจำปี 2552 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส โดยใช้แบบประเมิน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการทำงานของ อบจ. ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นหลักในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552) ในครั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้ดำเนินการตามกรอบการติดตามและประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ โดยได้ทำการประเมินตามขั้นตอน ดังนี้

การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ.

การประเมินในขั้นตอนนี้ ได้ทำการติดตามการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบประเมิน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทำการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ว่า อบจ. มีโครงการ งบประมาณ ได้ดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างไร นอกจากนี้ ได้ทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ก่อนนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาทำการประเมินผลการทำงานของ อบจ.

รายงานผลการประเมินนี้ เป็นการประเมินในรอบระยะเวลาสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552)

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. อบจ. หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
2. คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ หมายถึง คู่มือ “การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2552 – 2556) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
4. แผน 3 ปี หมายถึง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

บทที่ 2

ผลการประเมิน

การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552) ในรายงานฉบับนี้ เป็นการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คณะผู้ประเมินนำเสนอผลการประเมิน ดังนี้

ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ของ อบจ. ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552)

การประเมินในขั้นตอนนี้ เป็นการติดตามและประเมินการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. ของปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552) ได้ทำการติดตามการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงานประจำปี 2552 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมิน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยได้พิจารณาจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานประจำปี 2552 ดังนี้


1. โครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี (2552-2554) ของอบจ.

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 (พ.ศ.2552)		ปีที่ 2 (พ.ศ.2553)		ปีที่ 3 (พ.ศ.2554)		รวม (พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554)	
	โครงการ /กิจกรรม	งบ ประมาณ	โครงการ /กิจกรรม	งบ ประมาณ	โครงการ /กิจกรรม	งบ ประมาณ	โครงการ /กิจกรรม	งบ ประมาณ
1.น้ำ	38	54,155,000	81	129,400,000	80	197,100,000	199	380,655,000
2.การท่องเที่ยว	48	67,008,000	27	108,750,000	20	78,250,000	95	254,008,000
3.การศึกษา กีฬาและ วัฒนธรรม	45	52,790,000	45	49,190,000	45	49,190,000	135	151,170,000
4.คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	64	44,758,000	76	48,183,000	70	36,287,000	210	129,228,000
5.โครงสร้างพื้นฐาน	41	73,425,000	57	96,925,000	56	114,625,000	154	284,975,000
6.สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ	7	9,380,000	7	9,380,000	7	9,380,000	21	28,140,000
7.การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	119	61,086,500	58	30,736,500	47	27,523,000	224	119,346,000
รวม	362	362,602,500	351	472,564,500	325	512,355,000	1,038	1,347,522,000

จากตารางที่ 1 ในภาพรวมพบว่า อบจ. มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปีจำนวนทั้งสิ้น 1,038 โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ 1,347,522,000 บาท เป็นโครงการ/กิจกรรมของปี 2552 จำนวน 362 โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ 362,602,500 บาท และจากแผนภาพที่ 1 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน มีสัดส่วนของเงินงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.3 รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 18.5 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คิดเป็นร้อยละ 16.8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ำ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 14.6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 12.3 อย่างไรก็ตาม พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 6 สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ มีสัดส่วนของงบประมาณเพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้น

แผนภาพที่ 1 แสดงร้อยละของงบประมาณปี 2552 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

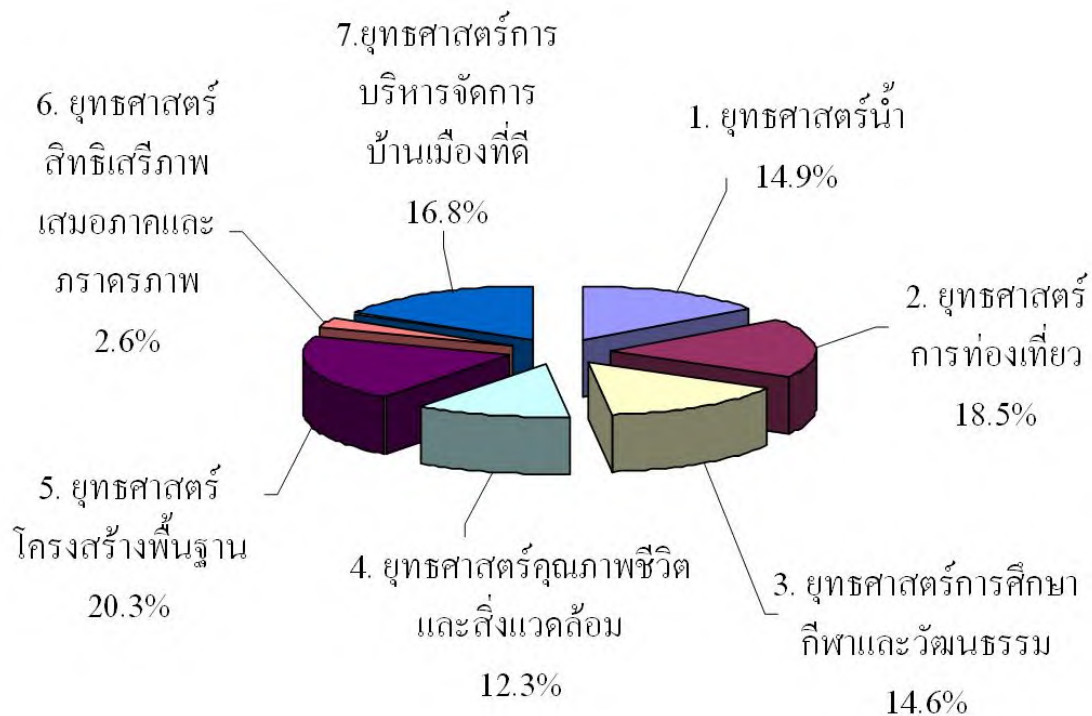


ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและสัดส่วนของงบประมาณไตรมาสที่ 3 เปรียบเทียบกับทั้งปีงบประมาณ 2552

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในปี 2552			จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในไตรมาสที่ 3		
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
1. น้ำ	38	54,155,000	14.9	27	35,030,000	64.7
2. การท่องเที่ยว	48	67,008,000	18.5	15	34,808,000	51.9
3. การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม	45	52,790,000	14.6	24	37,403,600	70.9
4. คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	64	44,758,000	12.3	39	36,028,700	80.5
5. โครงสร้างพื้นฐาน	41	73,425,000	20.3	34	52,065,000	70.9
6. สิทธิเสรีภาพ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต	7	9,380,000	2.6	4	1,580,000	16.8
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	119	61,086,500	16.8	27	40,172,000	65.8
รวม	362	362,602,500	100	170	237,087,300	65.4

จากตารางที่ 2 พบว่า งบประมาณปี 2552 ทั้งหมดมีจำนวน 362,602,500 บาท และในไตรมาสที่ 3 มีงบประมาณทั้งหมด 237,087,300 บาทจาก คิดเป็นร้อยละ 65.4 ของงบประมาณทั้งหมด เมื่อแยกพิจารณารายยุทธศาสตร์พบว่ายุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนของงบประมาณในไตรมาสที่ 3 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงไปยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 70.9 เท่ากัน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คิดเป็นร้อยละ 65.8 ยุทธศาสตร์น้ำ คิดเป็นร้อยละ 64.7 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 51.9 อย่างไรก็ตามพบว่าในยุทธศาสตร์สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพมีสัดส่วนของงบประมาณเพียงร้อยละ 16.8 เท่านั้น (ดังแผนภาพที่ 2)

แผนภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนของงบประมาณในไตรมาสที่ 3 เปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2552

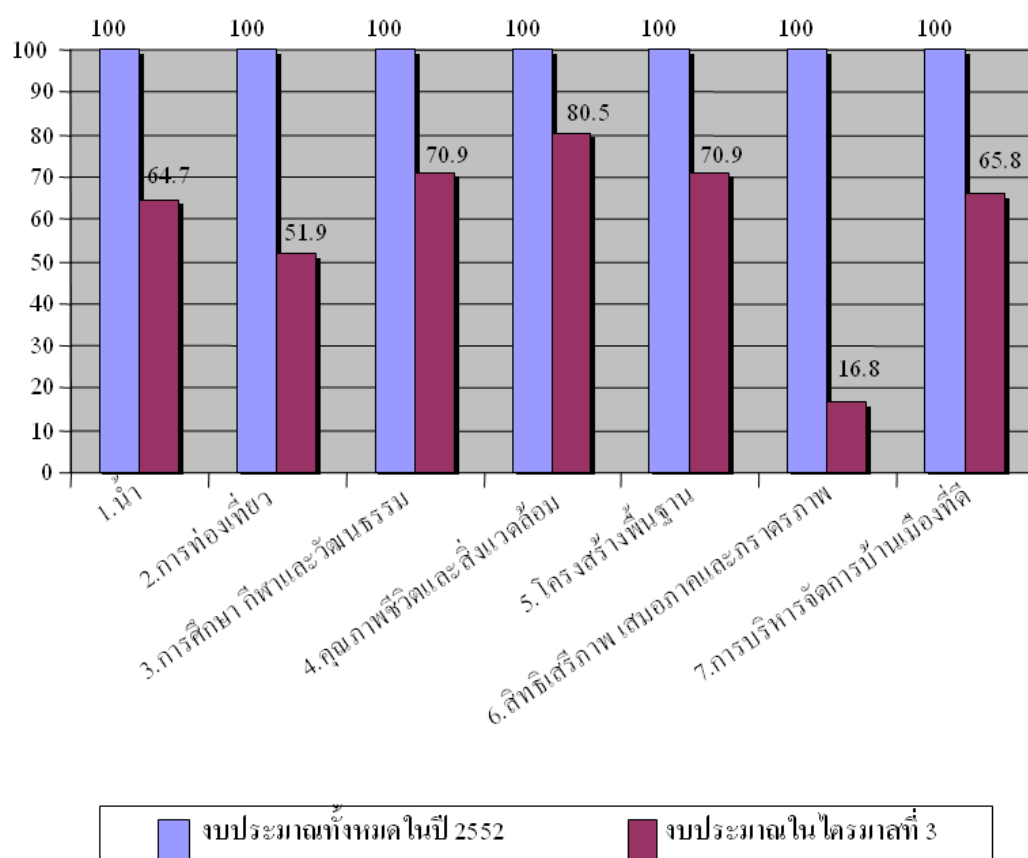

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2552 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552)

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2552 ไตรมาสที่ 3
(เมษายน - มิถุนายน 2552)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่มีการ ยกเลิก		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่มีการ เพิ่มเติม		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ทั้งหมดในไตร มาสที่ 3	
	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ
1.น้ำ	13	48.1	13	48.1	0	0.0	1	3.7	0	0.0	27	15.9
2.การท่องเที่ยว	2	13.3	9	60.0	4	26.7	0	0.0	0	0.0	15	8.8
3.การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม	10	41.7	11	45.8	1	4.2	2	8.3	0	0.0	24	14.1
4.คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	6	15.4	26	66.7	7	17.9	0	0.0	0	0.0	39	22.9
5.โครงสร้างพื้นฐาน	6	17.6	27	79.4	0	0.0	0	0.0	1	2.9	34	20.0
6.สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและ ภราดรภาพ	1	25.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	4	2.4
7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	9	33.3	16	59.3	1	3.7	1	3.7	0	0.0	27	15.9
รวม	47	27.6	103	60.6	15	8.8	4	2.4	1	0.6	170	100.0


จากตารางที่ 3 พบว่าจากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552) 170 โครงการ/กิจกรรม อบจ. ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 27.6 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 60.6 และเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 8.8 โครงการ/กิจกรรมที่มีการยกเลิก คิดเป็นร้อยละ 2.4 และโครงการ/กิจกรรมที่มีการเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 0.6 (ดังแผนภาพที่ 3)

หากพิจารณาตามรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ำมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 41.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คิดเป็นร้อยละ 33.3 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณายุทธศาสตร์ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จน้อย หรือมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการมาก ซึ่งควรได้รับการดูแลเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ หากแต่มีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการสูงถึงร้อยละ 50.0 (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4)

แผนภาพที่ 3 แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ มีการยกเลิก และมีการเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 3



แผนภาพที่ 4 แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการและ มีการยกเลิก และมีการเพิ่มเติม ไตรมาสที่ 3
จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

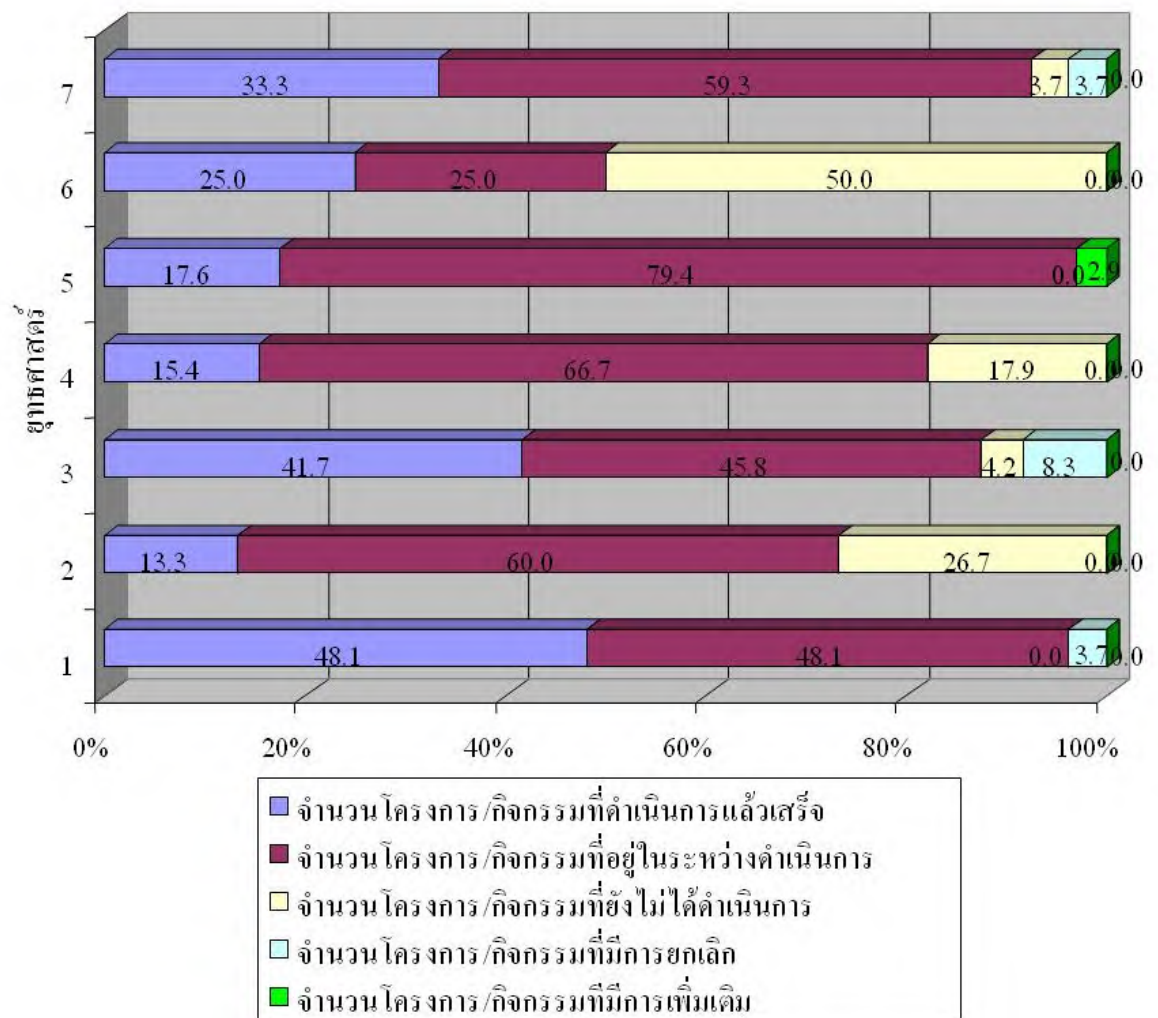


ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจำแนกตาม
ช่วงร้อยละของงานทั้งโครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ)								จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการทั้งหมด	
	1-25		26-50		51-75		76-99		จำนวน	ร้อยละ
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
1.น้ำ	2	15.4	1	7.7	5	38.5	5	38.5	13	12.6
2.การท่องเที่ยว	2	22.2	4	44.4	1	11.1	2	22.2	9	8.7
3.การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม	1	9.1	4	36.4	5	45.5	1	9.1	11	10.7
4.คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	5	19.2	2	7.7	10	38.5	9	34.6	26	25.2
5.โครงสร้างพื้นฐาน	2	7.4	9	33.3	15	55.6	1	3.7	27	26.2
6.สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและ ภราดรภาพ	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	5	31.3	4	25.0	5	31.3	2	12.5	16	15.5
รวม	18	17.5	24	23.3	41	39.8	20	19.4	103	100.0

จากตารางที่ 4 โดยภาพรวมพบว่า มีโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงร้อยละ 1-25 ของงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.5 รองลงมา อยู่ในช่วงร้อยละ 26-50 คิดเป็นร้อยละ 23.3 อยู่ในช่วงร้อยละ 51-75 คิดเป็นร้อยละ 39.8 และอยู่ในช่วงร้อยละ 76-99 คิดเป็นร้อยละ 19.4 (ดังแผนภาพที่ 5)

เมื่อแยกพิจารณายุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานมีโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 26.2 โดยแยกเป็นโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงร้อยละ 51-75 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมาอยู่ในช่วง ร้อยละ 26-50 คิดเป็นร้อยละ 33.3 และอยู่ในช่วงร้อยละ 1-25 คิดเป็นร้อยละ 7.4 และในช่วงร้อยละ 76-99 คิดเป็นร้อยละ 3.7 อย่างไรก็ตามพบว่ายุทธศาสตร์ที่ 6 สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและ ภราดรภาพมีโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดเพียง 1 โครงการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 1.0 และอยู่ระหว่างดำเนินงานในช่วงร้อยละ 1-25

แผนภาพที่ 5 แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ

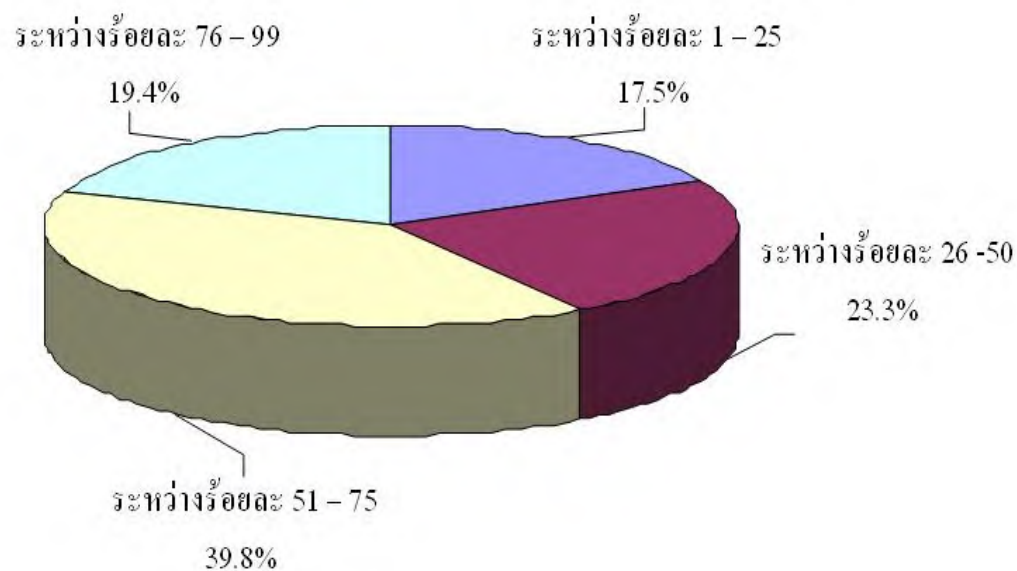

3. การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2552 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552)


ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณทั้งหมดและงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายของ อบจ. ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3		เงินสะสม		งบประมาณทั้งหมดในไตรมาสที่ 3	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.น้ำ	18,028,376	51.5	0	0	35,030,000	14.8
2.การท่องเที่ยว	13,705,735	39.4	0	0	34,808,000	14.7
3.การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม	19,041,689	50.9	0	0	37,403,600	15.8
4.คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	18,132,395	50.3	0	0	36,028,700	15.2
5.โครงสร้างพื้นฐาน	15,886,081	30.5	0	0	52,065,000	22.0
6.สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ	370,000	23.4	0	0	1,580,000	0.7
7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8,462,841	21.1	0	0	40,172,000	16.9
รวม	93,627,117	39.5	0	0	237,087,300	100.0

จากงบประมาณทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552) จำนวนทั้งสิ้น 237,087,300 บาท พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปจำนวน 93,627,117 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.5 ของงบประมาณทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 (รายละเอียดดังตารางที่ 5)

โดยเมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ำ มีสัดส่วนของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 3 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 50.9 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 50.3 (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 6)

แผนภาพที่ 6 แสดงร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2552 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

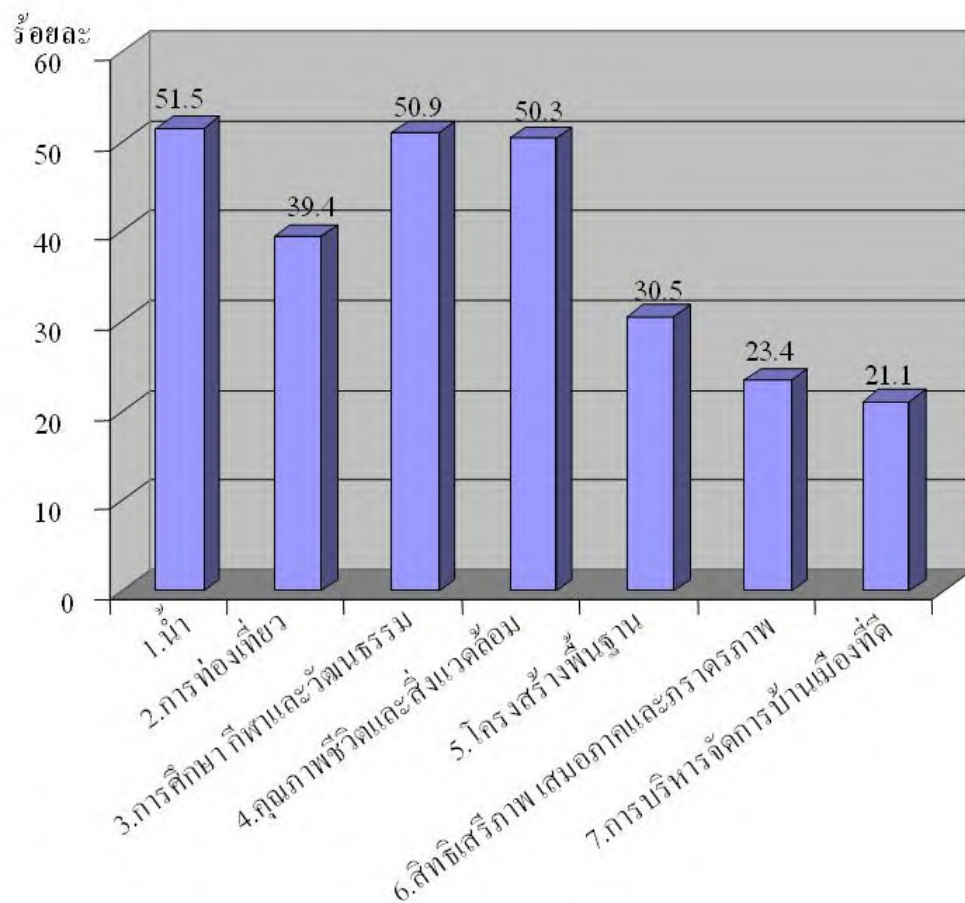

4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2552

ตารางที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2552

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

จากตารางที่ 6 พบว่า อบจ. ไม่มีโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปี 2552

บทที่ 3

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ไตรมาสที่ 3

ปัญหา

1. การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างในสัญญาไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาดำเนินการ โครงการที่กำหนดไว้ในแผน

ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของสัญญาว่าจ้างให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่ได้รับ การอนุมัติแล้ว

ปัญหา

2. การดำเนินงานโครงการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ข้อเสนอแนะ

ควรหาข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานและโครงการ

ปัญหา

3. โครงการบางโครงการ ขัดต่อระเบียบการพัสดุฯ ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้บังคับใช้ภาย หลังจากที่โครงการได้รับอนุมัติแล้ว

ข้อเสนอแนะ

ขอหารือเพื่อผ่อนผันการใช้ระเบียบในการดำเนินโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ เป็นผลอาจต้องขอปรับปรุงหรือยกเลิกโครงการ

ปัญหา

4. การจัดซื้อพัสดุไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันกำหนดได้เนื่องจากต้องรอจัดซื้อ พร้อมกันหลาย หน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานต่าง ๆ ควรวางแผนร่วมกันในการจัดซื้อพัสดุตามเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน

ปัญหา

5. โครงการบางโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความ ร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งในบางช่วงเวลาของการดำเนินโครงการอยู่ใน ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาดำเนินการออกไป

ข้อเสนอแนะ

ก่อนจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ควรศึกษาให้ชัดเจนว่าประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้หรือไม่

ปัญหา

6. โครงการบางโครงการล่าช้า เพราะต้องประสานงาน หรือขอข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ กับส่วนท้องถิ่นอื่น แต่ได้รับข้อมูลตอบกลับล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลที่ อบจ.ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ ฐานข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชน เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

1. คู่มือ “การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2552 – 2556) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
3. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
4. แผนดำเนินงานประจำปี 2552 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
5. แผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครสวรรค์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555)

ภาคผนวก ก

แผนการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน 2552)

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์นำ

1.1 แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำให้พอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

[illegible]

[illegible]

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
9	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลนาขอม เชื่อมต่อตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.21 น.97	1,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	960,000	ม.ก. - พ.ค. 52	2-3
10	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1,2,6 ตำบลพิบูล เชื่อมต่อตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.22 น.97	1,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	940,000	ม.ก. - พ.ค. 52	2-3
11	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 10,1 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.23 น.97	1,000,000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ก.พ. - มิ.ย. 52	2-3
12	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลมะมั่ง เชื่อมต่อตำบลพิบูล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.24 น.97	1,000,000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ. - มิ.ย. 52	2-3

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
13	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง เชื่อมต่อดำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.25 น.98	1,000,000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ก.พ. - มิ.ย. 52	2-3
14	ชุดลอกหนองแม่พังงา หมู่ที่ 2 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.27 น.98	1,500,000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ. - มิ.ย. 52	2-3
15	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 10 ตำบลพนมรอก เชื่อมต่อดำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.28 น.98	800,000	-	-	-	-	-	1	-	-	760,000	ก.พ. - มิ.ย. 52	2-3
16	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลคอนคา เชื่อมต่อดำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.30 น.99	1,900,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,790,000	ก.พ. - มิ.ย. 52	2-3

[illegible]

[illegible]

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
25	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่	2,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,930,000	ก.พ. - มิ.ย. 52	2-3
	อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์												
	เชื่อมต่อตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์												
	จังหวัดกำแพงเพชร												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.50 น.103												
26	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000,000	-	-	-	-	1	-	-	-	3,175,375.88	ต.ค. 51- ก.ย. 52	1-4
	สำหรับเครื่องจักรกล เพื่อสนับสนุน												
	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ												
	"เศรษฐกิจพอเพียง"												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 1.3.6.4 น.64												
27	จัดทำแผนที่จำลองจังหวัดนครสวรรค์	430,000	-	-	-	-	-	1	-	-	430,000	ธ.ค. 51- พ.ค. 52	1-3
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.11.3 น.90												
งบประมาณ		35,030,000	0	2	1	5	5	13	1	0	18,028,376		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยว

กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.1 แนวทางการผลักดันบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับภูมิภาค

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการพัฒนาบึงบอระเพ็ดและ ประมงเชิงพาณิชย์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.3.6.2 น.64	4,000,000	-	-	-	-	1	-	-	-	3,999,902.96	ต.ค. 51- ก.ย. 52	1-3
2	ปรับปรุง/ก่อสร้างสถานที่ภายในโครงการ พัฒนาบึงบอระเพ็ด ด้านการท่องเที่ยว 2.1 ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.54 น.104	2,630,000	-	-	-	-	-	1	-	-	2,629,500	ม.ค. -พ.ค. 52	2-3
	2.2 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.55 น.104	3,620,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ม.ค. -พ.ค. 52	2-3

กองกิจการพาณิชย์

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว

[illegible]

กองกิจการพาณิชย์

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.4 แนวทางผลักดันให้บึงบอระเพ็ดเป็นครัวปลาประเทศ

[illegible]

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
2	ศึกษาอบรมครูงานและจัดประชุมด้านการผลิตอาหารปลา แปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ	600,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.-ก.ย.52	3-4
	อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.10 น.142												
3	ครัวปลาประเทศ	2,000,000	-	1	-	-	-	-	-	-	177,965	ม.ค.ก.ย.52	3-4
	อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.11 น.142												
4	ปรับปรุงระบบประปาภายในโครงการแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดบึงบอระเพ็ด (ประมงเชิงพาณิชย์)	330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000	เม.ย.-ก.ย.52	3-4
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.6.9 น.156												
5	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวภายในโครงการแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดบึงบอระเพ็ด (ประมงเชิงพาณิชย์)												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.1 น.156	100,000	-	1	-	-	-	-	-	-	10,317.81	มี.ค.-พ.ค.52	2-3
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2 น.156	700,000	-	-	-	-	1	-	-	-	629,781	พ.ค.-ก.ย.52	3-4

กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.4 แนวทางผลักดันให้บึงบอระเพ็ดเป็นครัวปลาประเทศ

[illegible]

กองกิจการพาณิชย์

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.5 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.1 น.139 3,000,000 โอนลด 300,000	2,700,000	-	-	1	-	-	-	-	-	734,210	ต.ค.51-ก.ย.52	1-4
2	อุดหนุนศูนย์ กกท.จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการเผยแพร่ศิลปะกีฬามวยไทย และมวยสากล อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.1 น.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.-พ.ย.51	1
3	อบรมสัมมนาทัศนศึกษาและดูงานเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.3 น.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.-ก.ย.52	4
4	อุดหนุนศูนย์ กกท.จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.3 น.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.-พ.ย.51	1
5	สนับสนุนสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 ฝ่ายปฏิบัติการ 6 กองบังคับการตำรวจ ท่องเที่ยวโครงการจัดทำหนังสือรวมภาพ แหล่งท่องเที่ยวครบวงจรบึงบอระเพ็ดและ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัด อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.2 น.157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ต.ค.-พ.ย.51	1
งบประมาณ		34,808,000	4	2	4	1	2	2	0	0	13,705,735		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

3.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ บุคลากรด้านการศึกษา อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.1 น.128	1,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,000,000	ก.พ.-พ.ค.52	2-3
2	การฝึกอบรมและศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม ของประชาชน อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.5 น.129	1,670,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,670,000	มี.ค.-มิ.ย.52	2-3
3	จัดซื้อเครื่องดนตรี อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.4.1 น.134 อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.4.2 น.134	6,970,000 100,000	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	พ.ค.-ก.ค.52 พ.ค.-ก.ค.52	3-4 3-4
4	อุดหนุนโรงเรียนนครสวรรค์ ตามโครงการพัฒนาห้องสมุด IT สู่ชุมชน อยู่ในข้อบัญญัติ 4.1.1 น.136	1,400,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,400,000	ม.ค.-ก.พ. 52	3
5	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 ตามโครงการมหกรรมทางวิชาการ อยู่ในข้อบัญญัติ 4.1.2 น.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค. 51-ม.ค. 52	1

[illegible]

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

[illegible]

[illegible]

กองช่าง

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

3.4 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
10	เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.-51	1
	อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.19 น.36												
11	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาภายในบึงบอระเพ็ด	6,695,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ม.ค.-พ.ค.52	2-3
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.8 น.82												

กองการศึกษาฯ

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

3.4 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬา

12	ส่งเสริมอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะมวยไทย	300,000	-	-	-	1	-	-	-	-	16,600	พ.ย. 51- ก.พ. 52	3
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.15 น.131												
งบประมาณ		37,403,600	1	1	4	5	1	10	2	0	19,041,689		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคูณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	สงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหา เดือดร้อนยากจน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.1 น.108	500,000	-	-	-	1	-	-	-	-	200,000	ศ.ค.-52	1-4
2	แว่นตาเพื่อโลกสวย อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.3 น.109	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.-ศ.ค.52	4
3	ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เอนกประสงค์ สำหรับผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.7 น.110	200,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	มิ.ย.-ก.ค.52	3-4
4	พัฒนาศักยภาพผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กเล็ก อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.9 น.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.-52	2
5	จัดอบรมและฝึกอาชีพคนพิการในชุมชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.12 น.111	100,000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.-พ.ค.52	3

[illegible]

[illegible]

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.2 แนวทางการส่งเสริม พัฒนากลุ่มสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และมีบทบาทในทุกเวที สิทธิสตรีเท่าเทียมชายอย่างเป็นรูปธรรม

[illegible]

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง

[illegible]

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.4 แนวทางการส่งเสริมด้านสาธารณสุขเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

[illegible]

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.4 แนวทางการส่งเสริมด้านสาธารณสุขเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

[illegible]

[illegible]

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

กองกิจการพาณิชย์

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.6 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน องค์กรประชาชนและผลักดันให้เกิดกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกตำบล

[illegible]

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.7 แนวทางส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีชุมชน

[illegible]

[illegible]

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.9 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

[illegible]

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.10 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดการค้าจากแหล่งกำเนิด

[illegible]

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.11 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน	500,000	-	-	-	-	-	1	-	-	264,247	ช.ค.51-ก.ย.52	1-4
	อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.9 น.58												
งบประมาณ		36,028,700	7	5	2	10	9	6	0	0	18,132,395		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.1 แนวทางพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 3 ตำบลพระนอน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.2 น.92	2,000,000	-	-	-	1	-	-	-	-	2,000,000	ธ.ค.51-เม.ย.52	1-3
2	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7-6 ตำบลหนองตา อำเภอบรรพตพิสัย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.4 น.93	1,000,000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ธ.ค.51-เม.ย.52	1-3
3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ 4,8 ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงปลา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.5 น.93	1,200,000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.51-เม.ย.52	1-3
4	ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลตาตัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.8 น.94	1,950,000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ม.ค.-ก.ค.52	2-4

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
5	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 ตำบลศรีอยะคร เชื่อมต่อ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ 3) อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.9 น.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.51-มี.ค.52	1-2
6	ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1,9 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.10 น.94	1,900,000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ม.ค.-ก.ค.52	2-4
7	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.11 น.94	2,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,880,000	ธ.ค.51-เม.ย.52	1-3
8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ตำบลวังม้า เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.12 น.95	2,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,990,000	ธ.ค.51-เม.ย.52	1-3

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
9	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลท่านบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.14 น.95	1,900,000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ธ.ค.51-เม.ย.52	1-3
10	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.16 น.95	1,000,000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	ธ.ค.51-เม.ย.52	1-3
11	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.17 น.96	1,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.51-เม.ย.52	1-3
12	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำคด อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลคอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.18 น.96	1,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.51-เม.ย.52	1-3
13	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6-7 ตำบลทับกฤช เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.26 น.98	2,500,000	-	-	-	-	-	1	-	-	2,285,000	ธ.ค.51-พ.ค.52	1-3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
29	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านธารห้วย- บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ 2) เพิ่มโครงการตามใบโอน 22/52 ลว. 16 มี.ย. 52	500,000	-	-	-	-	-	-	-	1	-		

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.2 แนวทางส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1	ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันคลื่น และปรับสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 17 ตำบลเขาชนกัน เชื่อมต่อดำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.32 น.99	1,400,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ช.ค.51-เม.ย.52	1-3
---	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	-----

สำนักปลัดฯ

5. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.2 แนวทางส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2	ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดขั้นวินัยจราจร และลดอุบัติเหตุทางถนน (งาน 365 วันอันตราย หยุดการตายด้วย วินัยจราจร) อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.6 น.23	200,000	-	-	-	1	-	-	-	-	199,000	ต.ค. 51 - ก.ย.. 52	1-4
---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------------------	-----

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.2 แนวทางส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
3	การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย	225,000	-	-	1	-	-	-	-	-	108,300	มี.ค.-พ.ค. 52	2-3
	ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำ อบจ.												
	นครสวรรค์												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.14 น.60												
4	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000	-	1	-	-	-	-	-	-	210,350.60	ต.ค.51-ก.ย.52	1-4
	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 1.3.6.3 น.64												
5	จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและ	1,000,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	เม.ย.-พ.ค.52	3
	บรรเทาสาธารณภัย												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.5.1 น.79												
6	ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณ	2,100,000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ก.พ.-พ.ค.52	2-3
	ไฟจราจร อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.11.9 น.91												
งบประมาณ		52,065,000	0	2	9	15	1	6	0	1	15,886,081		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ

กองกิจการสภาฯ

6. ยุทธศาสตร์สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ

6.1 แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วม	300,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.-ก.ย. 52	2 - 4
	ร่วมในการพัฒนาการเมือง การปกครอง												
	ในระบอบประชาธิปไตย และแนวทางการมี												
	ส่วนร่วมทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.1 น.32												
2	ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่	300,000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค. 51- ก.ย. 52	1 - 4
	ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นแก่												
	ประชาชน												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.10 น.34												
	(โอนลด 200,000 บาท)												

กองการศึกษาฯ

6. ยุทธศาสตร์สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ

6.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักสามัคคี และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

1	การฝึกยุวชนทหาร												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.3 น.128	250,000	-	-	-	-	-	1	-	-	250,000	ก.ค. - ธ.ค. 52	3
2	จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	730,000	-	1	-	-	-	-	-	-	120,000	มี.ค. - มี.ย. 52	3
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.6 น.129												
งบประมาณ		1,580,000	2	1	0	0	0	1	0	0	370,000		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กองกิจการสภาฯ

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น

[illegible]

กองแผนฯ

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสัมพันธ์ในการบริหารจัดการท้องถิ่น

3	การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. นครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 4.1 น.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ม.ก. - มี.ก. 52	4	
4	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.4 น.41 (โอนลด 80,000)	420,000	-	-	-	-	-	1	-	-	152,389	ม.ก. - พ.ก. 52	2-3

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
5	การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.5 น.42	200,000	-	-	-	-	1	-	-	-	12,330	ก.พ.-เม.ย. 52	3
6	ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic center อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.6 น.42	500,000	-	-	-	-	-	1	-	-	64,016	ธ.ค. 51 - ก.ย. 52	1-4

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

1	ฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารและข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.1 น.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.ค.-ก.ช. 52	4
2	ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.2 น.22 (โอนลด 300,000.-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โอนลด2.2.3.5 คชจ. ในการ ประชาสัมพันธ์ตาม อำนาจหน้าที่ ของ อบจ. ม.ค.-ก.ช. 52	2-4

[illegible]

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

[illegible]

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

[illegible]

[illegible]

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

[illegible]

[illegible]

[illegible]

กองคลัง

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

[illegible]

กองช่าง

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

[illegible]

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

[illegible]

[illegible][illegible]

กองการศึกษาฯ

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
16	จัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา												
	1. จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน มาตรฐาน มอก. จำนวน 4 ตู้ อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.1.1 น.132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	ม.ก.-ก.พ.52	2
	2. จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้และ กระจก จำนวน 2 ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	ม.ก.-ก.พ.52	2
	อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.1.2 น.132												
	3. จัดซื้อโต๊ะพับขาสเตนเลส พื้นไม้โฟมเก่า ขนาด 24 x 72 x 29 จำนวน 100 ตัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.-มี.ค.52	2
	อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.1.3 น.132												
	4. จัดซื้อเก้าอี้ชนิดขาเหล็ก ขอบโครเมียม พื้นนั่ง และพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยไวนิล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ก.พ.-มี.ค.52	2
	จำนวน 300 ตัว												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.1.4 น.133												
	5. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด พร้อมติดตั้ง	650,000	-	-	-	-	-	1	-	-	650,000	ก.พ. - มี.ค. 52	3

[illegible][illegible]

กองกิจการพาณิชย์

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

[illegible]

	3. จัดซื้อแท่นบรรยายขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.-ธ.ค.51	1
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.2.3 น.148												

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
	4. จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแก็บ จำนวน 1 คัน	650,000	-	-	-	-	-	1	-	-	650,000	ม.ค. -มี.ค. 52	3
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.2.1 น.149												
	5. จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	3,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เม.ย.-มิย.523	3
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.3 น.150												
	6. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.-ธ.ค.551	1
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.4.1 น.152												
	7. กล้องวงจรปิดชนิดสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 ชุด	500,000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	ม.ค.51-เม.ย.52	2-3
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.4.2 น.152												
	8. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer) จำนวน 3 เครื่อง	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.51-ก.พ.52	1-2
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.5.1 น.153												
	9. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	พ.ย.51-ก.พ.52	1-2

อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.2 น.38												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
	3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธ.ค.-51	1
	จำนวน 1 เครื่อง												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.3 น.39												
งบประมาณ		40,172,000	1	5	4	5	2	9	1	0	8,462,841		

ภาคผนวก ข

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานและคำอธิบาย

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม “คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้

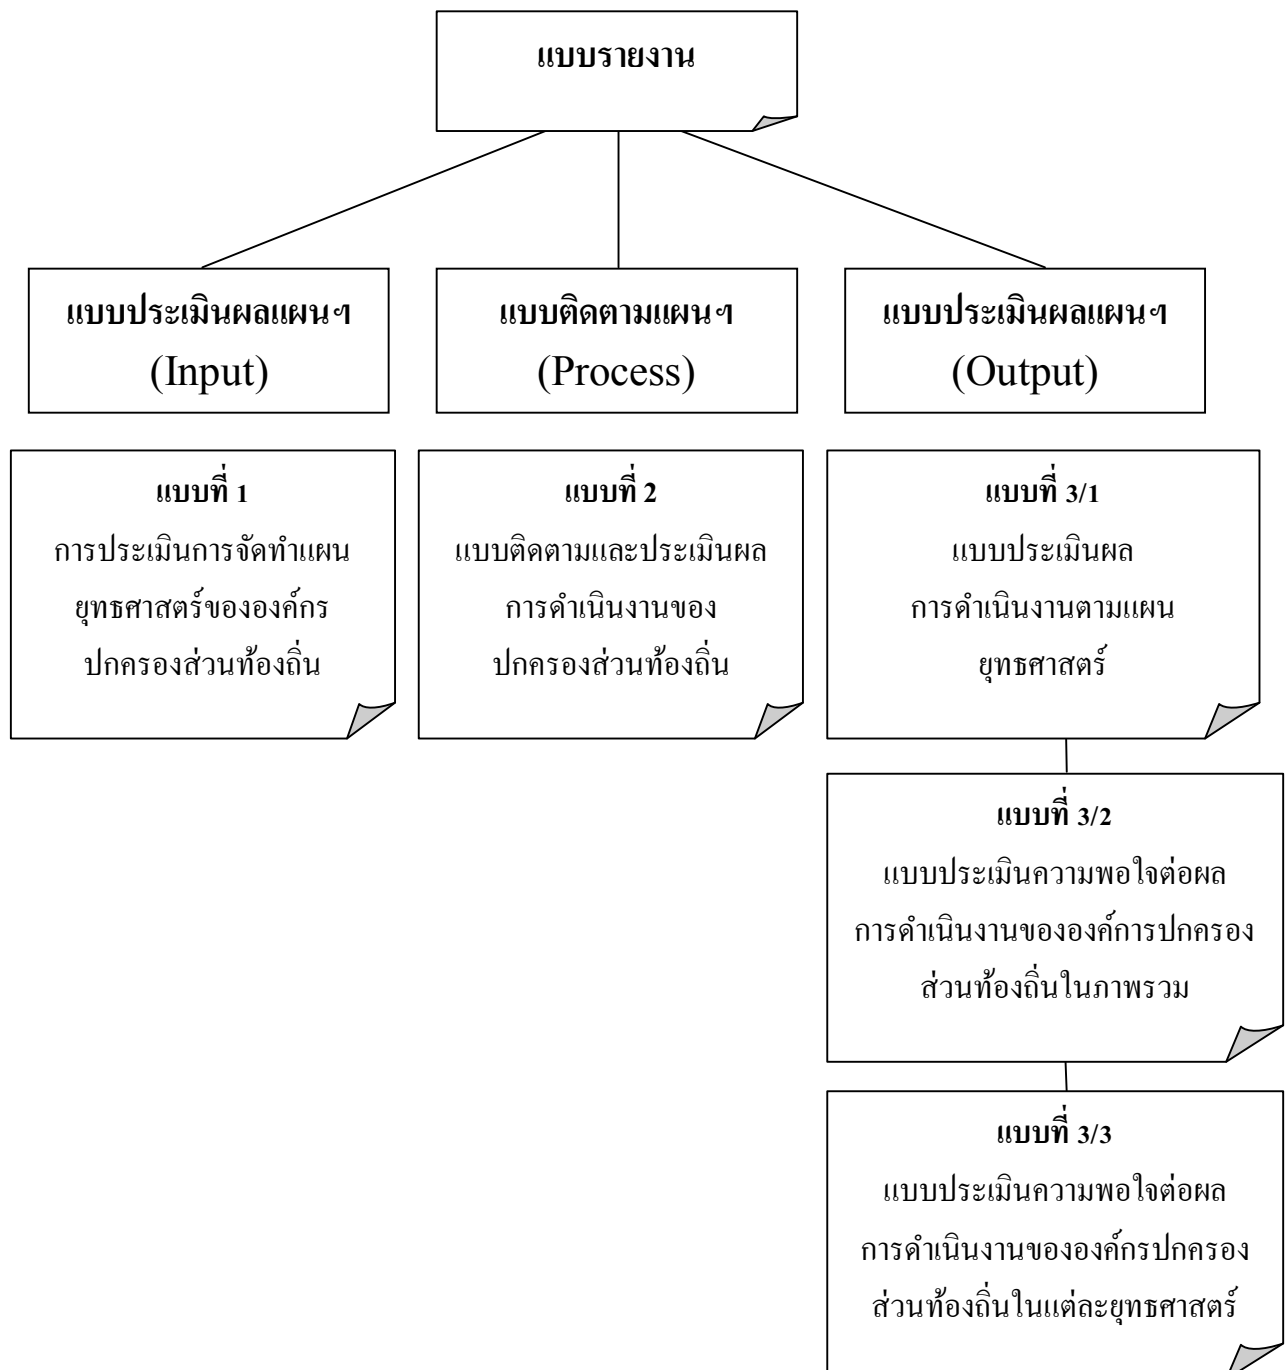

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
 - (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 - (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 - (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
 - (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1.....		ปีที่ 2		ปีที่ 3		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
รวม								

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1.....		ปีที่ 2		ปีที่ 3		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
รวม								

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี.....

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
รวม						

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.....

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
รวม					

[illegible]

คำอธิบายแบบ

ข้อ	ข้อความถาม	ความหมาย	การวัด และการนำเสนอผล
1	ชื่อองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	: ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการ บันทึกข้อมูล	หน่วยวัด : -
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : -
			วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : -
			เกณฑ์ในการพิจารณา : -
2	รายงานผลการ ดำเนินงานไตรมาสที่	: ช่วงเวลาที่ทำติดตามผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจำแนก เป็น 4 ไตรมาส ไตรมาสละ 3 เดือนตาม ปีงบประมาณคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)	หน่วยวัด : รายงานไตรมาสที่...โดยใส่ เครื่องหมาย ✓ ลงบนไตรมาสที่ รายงาน
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : -
			วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : -
			เกณฑ์ในการพิจารณา พิจารณาเพียง ว่าเป็นรายงานในไตรมาสใด
3	จำนวนโครงการ และงบประมาณ ตามแผนพัฒนา 3 ปี	จำนวนโครงการและงบประมาณที่ระบุไว้ใน แผนพัฒนา 3 ปี จำแนกตามยุทธศาสตร์ที่ ท้องถิ่นกำหนดไว้	หน่วยวัด : จำนวนโครงการ และ งบประมาณ
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนา 3 ปี
			วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : -
			เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่า แผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ มีการกระจาย ของโครงการและงบประมาณในแต่ละ ยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร มีการ กระจุกตัวของโครงการและ งบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใด ยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ กับยุทธศาสตร์ใด

ข้อ	ข้อคำถาม	ความหมาย	การวัด และการนำเสนอผล
4	จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	จำนวนโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์จังหวัด	หน่วยวัด : จำนวนโครงการ และงบประมาณ
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนา 3 ปี
			วิธีการวัด / สูตรการคำนวณ : -
			เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี
5	ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี	สถานการณ์ของผลจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนางานที่ผ่านมา วันที่ทำการรายงานโดยพิจารณาจาก จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม และจำนวนโครงการทั้งหมด	หน่วยวัด : จำนวนโครงการ
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนา 3 ปี
			วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : การคำนวณร้อยละสามารถทำได้โดยการนำเอาจำนวนโครงการที่เสร็จหรือโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหรือ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ตั้งหารด้วยจำนวนโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ แล้วคูณด้วย 100
			อาทิ มีจำนวนโครงการที่เสร็จในยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 10 โครงการ จาก 20 โครงการ ดังนั้นร้อยละของโครงการที่เสร็จในยุทธศาสตร์ที่ 1 จึงเท่ากับ $(10/20)/100 = 50\%$ เกณฑ์ในการพิจารณา : (1) ทำการ

ข้อ	ข้อคำถาม	ความหมาย	การวัด และการนำเสนอผล
			เปรียบเทียบข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้าว่า มีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นมาน้อยเพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนฯ (2) หากมีร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดในทางกลับกัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการที่ยกเลิก หรือที่เพิ่มโครงการมากเท่าไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายย่อมสะท้อนให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
6	การเบิกจ่ายงบประมาณปี	จำนวนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั้งที่เป็นงบปกติและเงินสะสมพร้อมเปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณที่ได้ระบุไว้	หน่วยวัด : งบประมาณที่เบิกจ่าย
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อ	ข้อคำถาม	ความหมาย	การวัด และการนำเสนอผล
			วิธีการวัด / สูตรการคำนวณ : การคำนวณร้อยละทำได้โดยการนำเอางบประมาณปกติหรืองบประมาณสะสมตั้งหารด้วยงบประมาณทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้หารด้วย 100 อาทิ ใช้งบปกติไป 100,000 บาทจากงบประมาณทั้งหมด 1,000,000 บาท ในยุทธศาสตร์ที่ 1 จะได้ $(100,000/1,000,000)*100 = 10\%$ เกณฑ์ในการพิจารณา : นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนฯ
7	โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี	:โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีที่ทำกรรายงานโดยพิจารณาในส่วนของผลการดำเนินงาน อาทิ จำนวนโครงการที่เสร็จ, จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ, จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงบประมาณ อาทิ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	หน่วยวัด : ระบุจำนวนและงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่าย ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง แหล่งข้อมูล : เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : - เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดำเนินงานของโครงการได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร
8	ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ	ปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	หน่วยวัด : - ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง แหล่งข้อมูล : การสัมภาษณ์ผู้ที่

ข้อ	ข้อคำถาม	ความหมาย	การวัด และการนำเสนอผล
			เกี่ยวข้อง
			วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : -
			เกณฑ์ในการพิจารณา : สรุปข้อมูล ปัญหาพร้อมทั้งนำไปพิจารณาร่วมกับ ข้อมูลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้เพื่อนำไป อธิบายถึงสาเหตุที่การดำเนินงานไม่ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่ กำหนด ตลอดจนเป็นข้อมูลสำหรับที่ จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การ ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก ค

รายนามคณะกรรมการ



คำสั่งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ที่ 105 / 2551

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2552

ตามที่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับการว่าจ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2552 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

1. รศ.ดร.วินัย	รังสีนันท์	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์วิบูลย์	บุญสุวรรณ	รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์ปณทิพย์	แสนสง	กรรมการ
4. อาจารย์วิรัช	กาฬศักดิ์	กรรมการ
5. อาจารย์จันทร์เพ็ญ	ดวงแก้ว	กรรมการ
6. อาจารย์กมลทิพย์	เหมือนสุวรรณ	กรรมการ
7. อาจารย์เยาวเรศ	กาฬศักดิ์	กรรมการ
8. อาจารย์จักรพันธ์	จันทร์เขียว	กรรมการ
9. อาจารย์เนาวรัตน์	ปิ่นอำนาจ	กรรมการ
10. อาจารย์วันชัย	เพ็งวัน	กรรมการ
11. อาจารย์บุษรา	ทองคงอยู่	กรรมการ
12. อาจารย์สุวิทย์	พลอยประดับ	กรรมการ
13. อาจารย์ฉัตรสุวรรณ	สบายใจ	กรรมการ
14. อาจารย์พิทยอาจ	สถาพรดำรงค์	กรรมการ
15. อาจารย์ฝนทิพย์	พัฒนาการค้า	กรรมการ
16. อาจารย์พัชรภรณ์	พิลาสมบัติ	กรรมการ
17. อาจารย์วิชัย	แสนสง	กรรมการ
18. อาจารย์จรรย์นันท์	กมลสินธุ์	กรรมการและเลขานุการ
19. อาจารย์สุเมธ	พิลึก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. อาจารย์ศุภรัตน์	ช่วยบุตรดา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552

(ดร.จินต์ วิชาตะกัลล)

อธิการบดี
